ETH ARGE HPQ

4- Wochenprogramm Tiefbau / Hochbau

20.06.2024

Schlechtwettertage sind nicht enthalten und verlängern entsprechend die Bauzeit.

Monat	Juni							Juli							Juli							Juli						
KW	26							27							28							29						
Tag	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
Datum	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

Arbeiten	Dauer	Bemerkungen
Baustelleneinrichtung		
Anlieferung Ost: Walzbeton einbringen		
Kranmontage Kran Nr.1		
Installationskanal Anlieferung		
Wände Et. 5C		
Wände / Stützen Et. 6		
Stützmauer West		
Decke Et.5		Dü: UA; Einleger OA
Sickerleitungen verlegen / Hinterfüllungsarbeiten		
Anlieferung Bereich Stützmauer Ost		
Baugrubenentwässerung		
Filterbrunnen Nr. 1 - 6 anpassen auf 3. Aushublage		
Aussteifung Baugrube		
Montage mit Aussteifung 3. Lage		
Aushub 3. Lage		
Aushubarbeiten		4. Lage
Betonlongarine 3. Lage		
Schlitzwandfläche bearbeiten, Holzeinlagen entfernen Betonlongarine schalen, bewehren und betonieren		
Baustellenabwasserbehandlung		
Betrieb Anlage ETH und Wolfgang-Pauli Strasse		

Inventar
Marti TB: RpBg 22to
Marti TB: RpBg 9to
EBAG Bagger, rp -30 to
EBAG Bagger, pb -18 to
EBAG Bagger, rp -5 to
EBAG Kompaktlader
EBAG Bulldozer
EBAG Radlader mit Strassenreinigungsbürste
EBAG Sennenbogen
Barmettler EWS-Bohrinstallation

Lärm	
Stufe 1 = Normal	
Stufe 2 = Erhöht	Stundenweise Fräs- und Spitzarbeiten SW
Stufe 3 = Hoch	

Anlieferung: Etappierung Bodenplatte/Wände

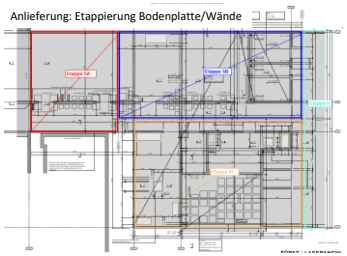

Baugrube: 3. Sprieslage



Anlieferung: Etappierung Decke
